

תעודת בדיקה מספר 7513228942

דף 1 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : גאמא הנדסה ומערכות ביטחון בע"מ ח.פ. : 514233832
מענו : האורגים 21 חולון
תאריך ההזמנה : 31/12/2025 תאריך ביצוע : 31/12/2025

תאור המוצר

פרטי התקנה
בדיקת אופיין רשת ציבורית
רחוב שד' דוד בן גוריון 37 גוש חלקה אשקלון
:פרויקט היכל הספורט העירוני

מהות הבדיקה

התאמה לסעיף 23.2.1 -בדיקת אפיון רשת מים, של התקן הישראלי ת"י 1596 - מערכת מתזים - התקנה, מיולי 2019
בהמשך למפורט במהות הבדיקה, פירוט סעיפי הבדיקה שלפיו נבדק המוצר - ראו בגוף התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

תעודת בדיקה מספר 7513228942

דף 2 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר



תעודת בדיקה מספר 7513228942

דף 3 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
23.2.1	בדיקת אפיון רשת מים			
	פרטי הבדיקה	תאריך הבדיקה: 31/12/25 שעת הבדיקה: 10:00		
	מיקום ביצוע מדידה	קוטר הידרנט מדידת ספיקה: 3 אינץ'; מיקום הידרנט מדידת ספיקה: הידרנט על הגמל הראשי בחלק הציבורי קוטר מיקום מדידת לחץ: 3 אינץ'; מיקום נקודת מדידת לחץ: הידרנט חנייה		
	ספיקה נמדדת	ראה תוצאות בנספח		
	נתוני ספיקות ולחצים	ראה תוצאות בנספח		

תעודת בדיקה מספר 7513228942

דף 4 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

נספח לסעיף 23.2.1 ספיקה נמדדת		
ספיקה נמדדת		
ספיקה מק"ש	ספיקה GPM	ספיקה LPM
100.6	443	1677

נספח לסעיף 23.2.1 נתוני ספיקות ולחצים			
נתוני ספיקות ולחצים			
לחץ (בר) סטטי	לחץ (בר) דינמי	לחץ (PSI) סטטי	לחץ (PSI) דינמי
4.6	2.6		


נספח לסעיף 23.2.1 נתוני ספיקות ולחצים		
לחץ (בר)	ספיקה (מ"ק/שעה)	ספיקה (ליטר לדקה)
1.4	130	2167
2	116	
2.5	103	

תעודת בדיקה מספר 7513228942

דף 5 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

לחץ לפי ספיקה ביחידות GPM

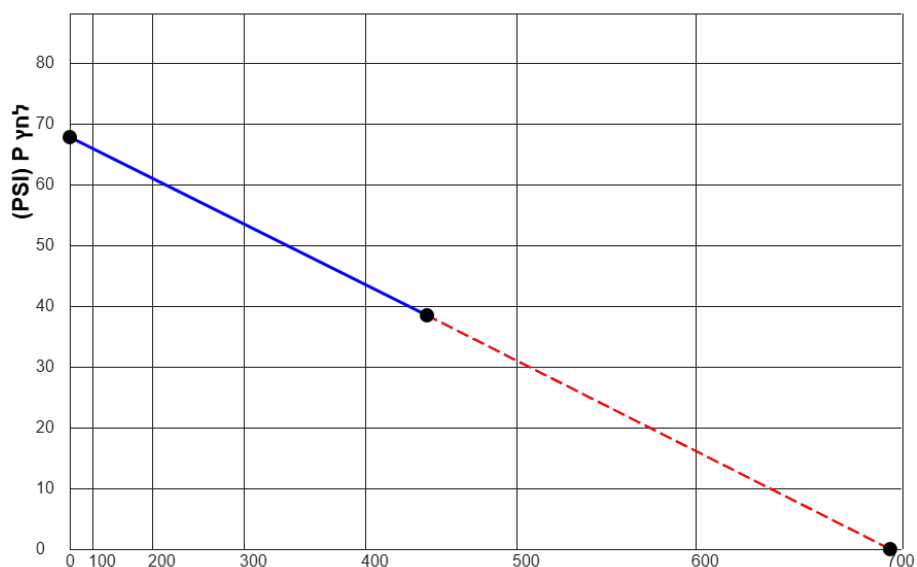

המרת המידות:

1 Atm = 14.69 psi

1 Bar = 14.5 psi

1 Gal = 3.785 Liter

ערכי תרשים = ספיקה Q (GPM)

סוף תעודת בדיקה
